

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

- ✓ Ejecución actual y desafíos en proyectos ley 21
- ✓ Otros temas relevantes de la infraestructura educativa
- ✓ Propuesta de inversión 2009 - 2011

PROYECTOS LEY 21 DE 1982
RESUMEN DE EJECUCIÓN 2003 - 2008


AULAS CONSTRUIDAS A LA FECHA						
	AÑO DE ENTREGA					
VIGENCIA	2004	2005	2006	2007	2008	TOTAL
2003	18	1.286	263	20	10	1.597
2004	0	48	518	242	124	932
2005	0	5	49	260	549	863
2006	0	0	0	15	313	328
2007	0	0	0	0	0	0
TOTAL AULAS ENTREGADAS	18	1.339	830	537	996	3.720
PROYECTOS EJECUTADOS	15	225	173	130	217	760
ESTUDIANTES BENEFICIADOS INFRAESTRUCTURA	760	69.854	54.366	30.492	65.466	220.938

METAS 2009 - 2010

AULAS POR CONSTRUIR			
	AÑO DE ENTREGA		
VIGENCIA	2009	2010	TOTAL
2005	174		174
2006	477		477
2007	1.091		1.091
2008	400	260	660
2009	200	900	1.100
TOTAL AULAS A ENTREGAR	2.342	1.160	3.502


CONSOLIDADO DE EJECUCION DE RECURSOS LEY 21 POR ENTIDAD TERRITORIAL VIGENCIAS 2003 – 2007

EJECUCION 75% - 100%

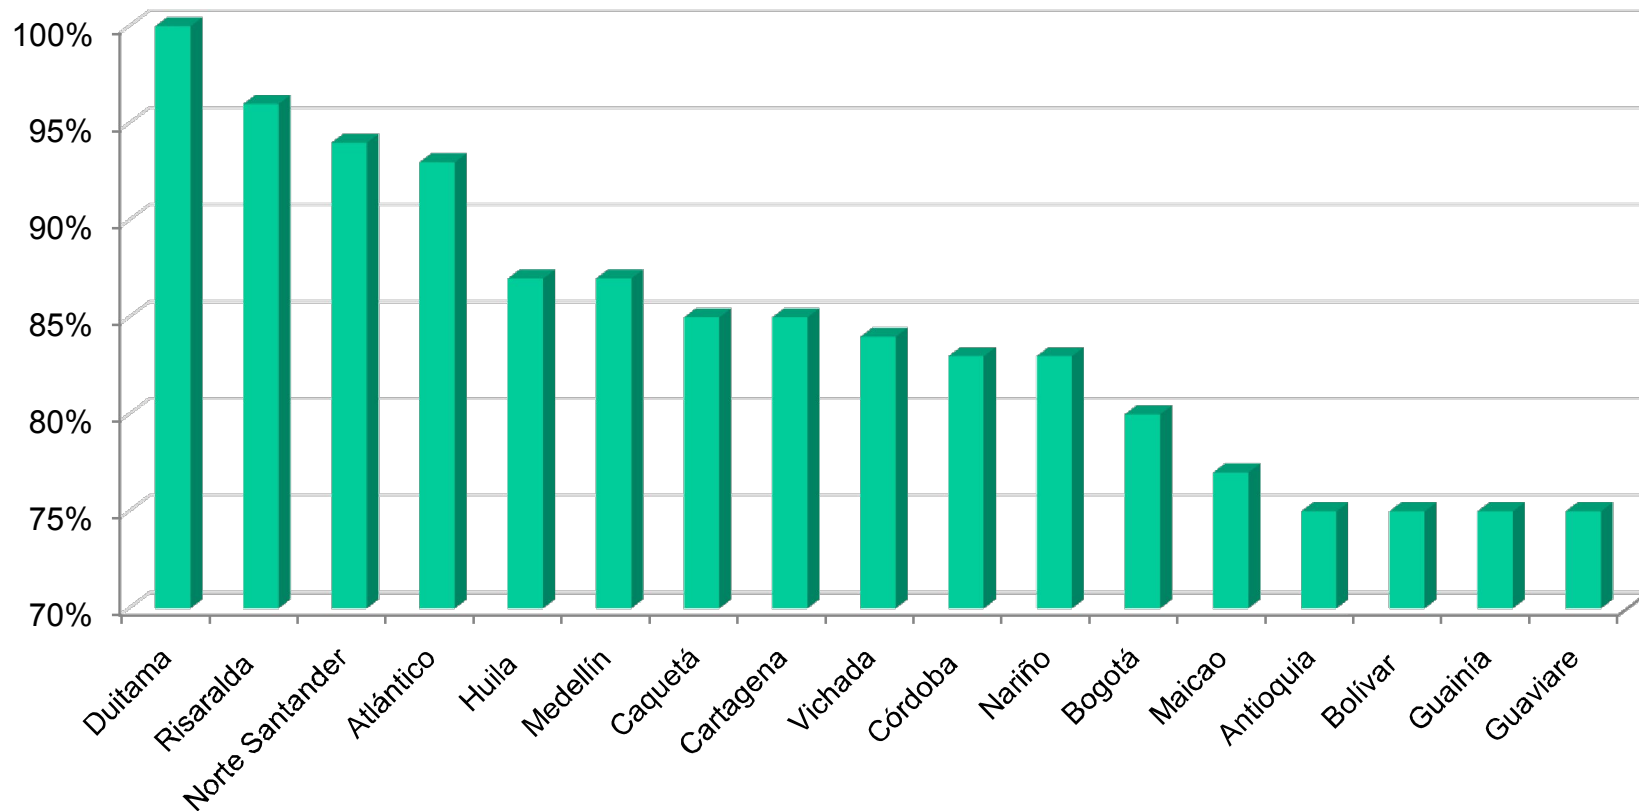


CONSOLIDADO DE EJECUCION DE RECURSOS LEY 21 POR ENTIDAD TERRITORIAL
VIGENCIAS 2003 – 2007

EJECUCION 75% - 100%
ENTIDADES SIN ASIGNACIÓN EN LA VIGENCIA 2007

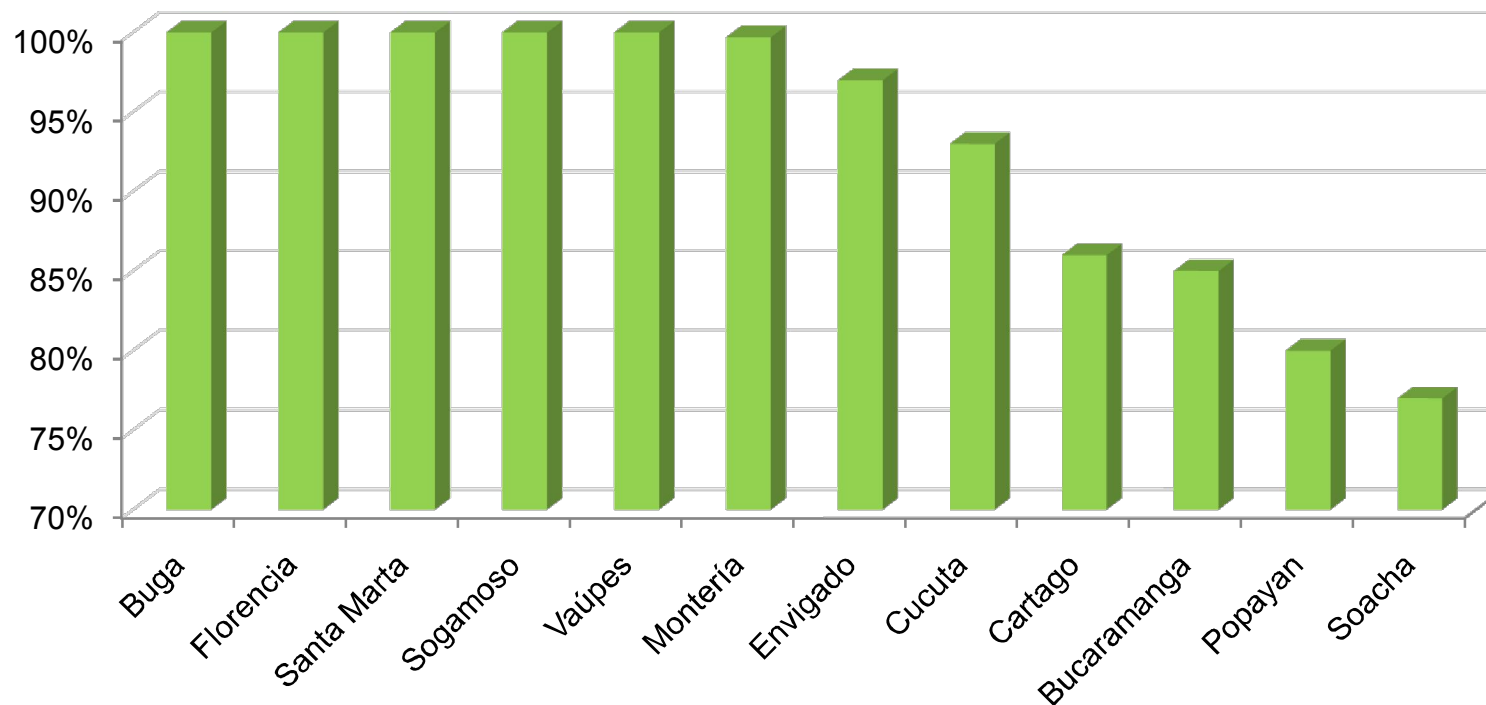


CONSOLIDADO DE EJECUCION DE RECURSOS LEY 21 POR ENTIDAD TERRITORIAL VIGENCIAS 2003 – 2007

EJECUCION 50% - 75%

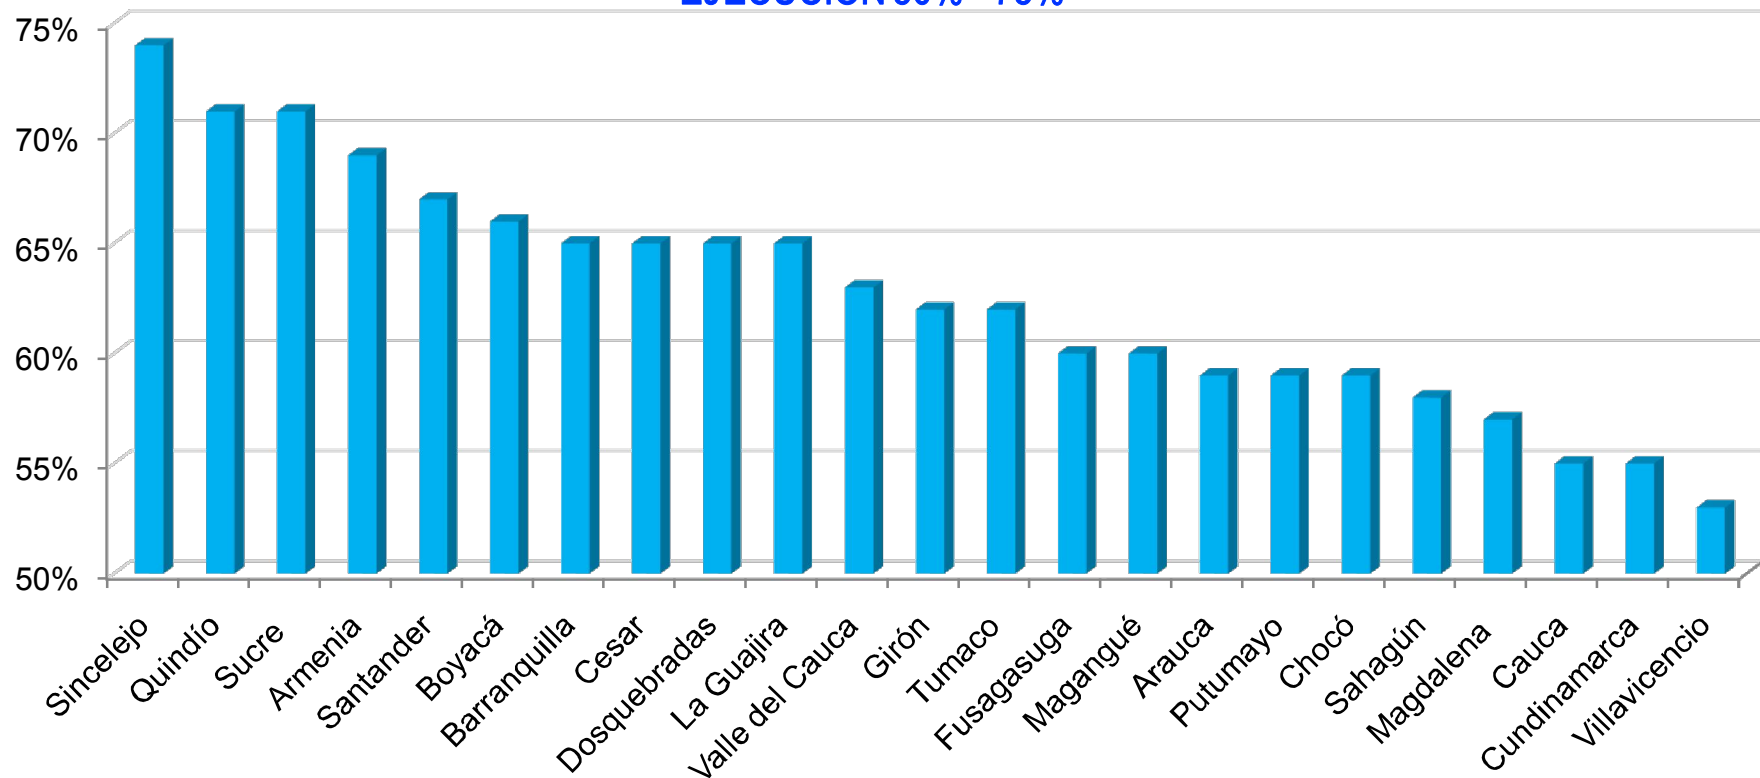

CONSOLIDADO DE EJECUCION DE RECURSOS LEY 21 POR ENTIDAD TERRITORIAL VIGENCIAS 2003 – 2007

EJECUCION 0% - 50%

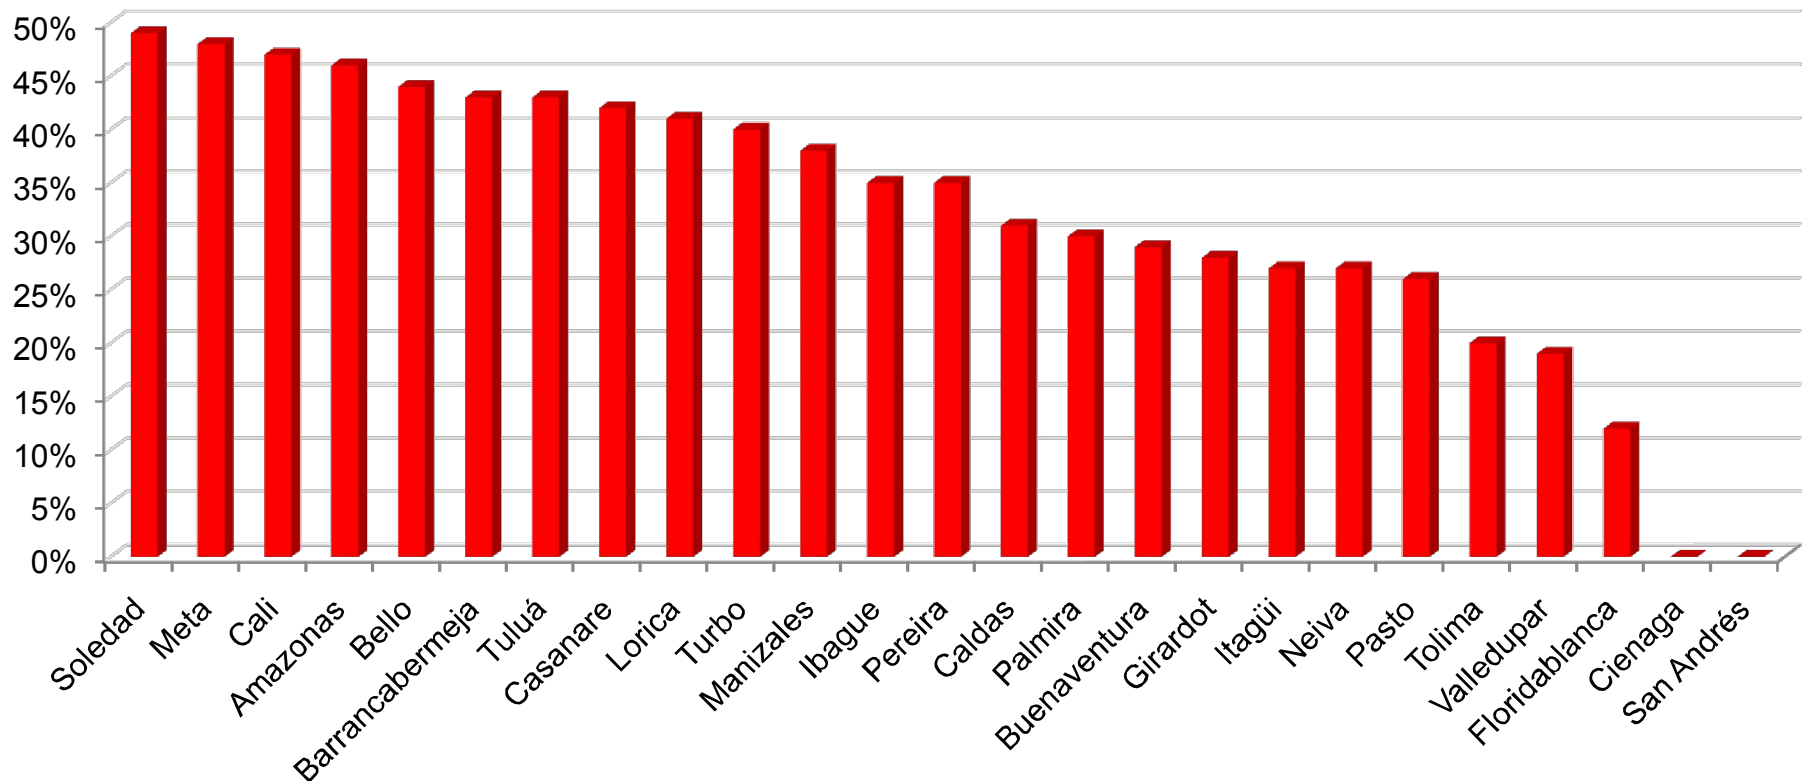

PROBLEMAS

- Titularidad del predio
- Poca gestión en el trámite de Licencias de Construcción
- Incorporación oportuna de recursos
- Demoras en los procesos de contratación
- Interventorías de obras
- Pagos oportunos a los contratistas



Soluciones propuestas

- Definir los proyectos estratégicos para el periodo y verificar la titularidad del predio
- Tramitar autorización para incorporar directamente los recursos de infraestructura
- Tramitar vigencias futuras para garantizar la continuidad de las obras y la oportuna contratación
- Definir procesos administrativos que garanticen la eficiencia administrativa

DESAFIOS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

- ✓ Ajuste y compromiso en ejecución de cronograma propuesto
- ✓ Culminación en 2009 de todos los proyectos aprobados 2003 -2008
- ✓ Definición de proyectos a 30 de marzo de 2009 para remitir a estudio con titularidad definida.
- ✓ Tramite oportuno de solicitud de incorporación de recursos
- ✓ Tramite de vigencias futuras y procesos listos para iniciar obras oportunamente y evitar traumatismo de vigencias futuras
- ✓ Inicio de las obras correspondientes a 2009 en el mismo año

ACCIONES EN CURSO


BASES DE PLANEACIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Inventarios y Planes de Infraestructura:

- Requisitos para acceder a recursos a partir de la vigencia 2008 de acuerdo a la resolución 3350 de 2007.
- **El Inventario de infraestructura** permitirá a las Secretarías evaluar, cuantificar y cualificar el estado de los ambientes escolares existentes. Para su levantamiento y sistematización, el MEN apoya la metodología SICIED – Sistema Interactivo de Consulta de Infraestructura Educativa, herramienta que facilita el análisis de la información capturada.
- **Los Planes de Infraestructura** permitirán a los entes territoriales priorizar las necesidades de infraestructura de las Instituciones Educativas y proyectar alternativas de solución con costos estimados e impactos en cobertura.
- Cofinanciación del MEN – 70% Nuevos departamentos, 50% departamentos, 35% municipios certificados Previo estudio y aprobación MEN.

RELACION DE INVENTARIOS	
ENTIDADES CON INVENTARIO	12
ENTIDADES COFINANCIADAS PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS	41
ENTIDADES QUE ADELANTAN INVENTARIO CON RECURSOS PROPIOS	10
ENTIDADES SIN INVENTARIO (2009)	17
TOTAL	80

PROPUESTA DE INVERSIÓN

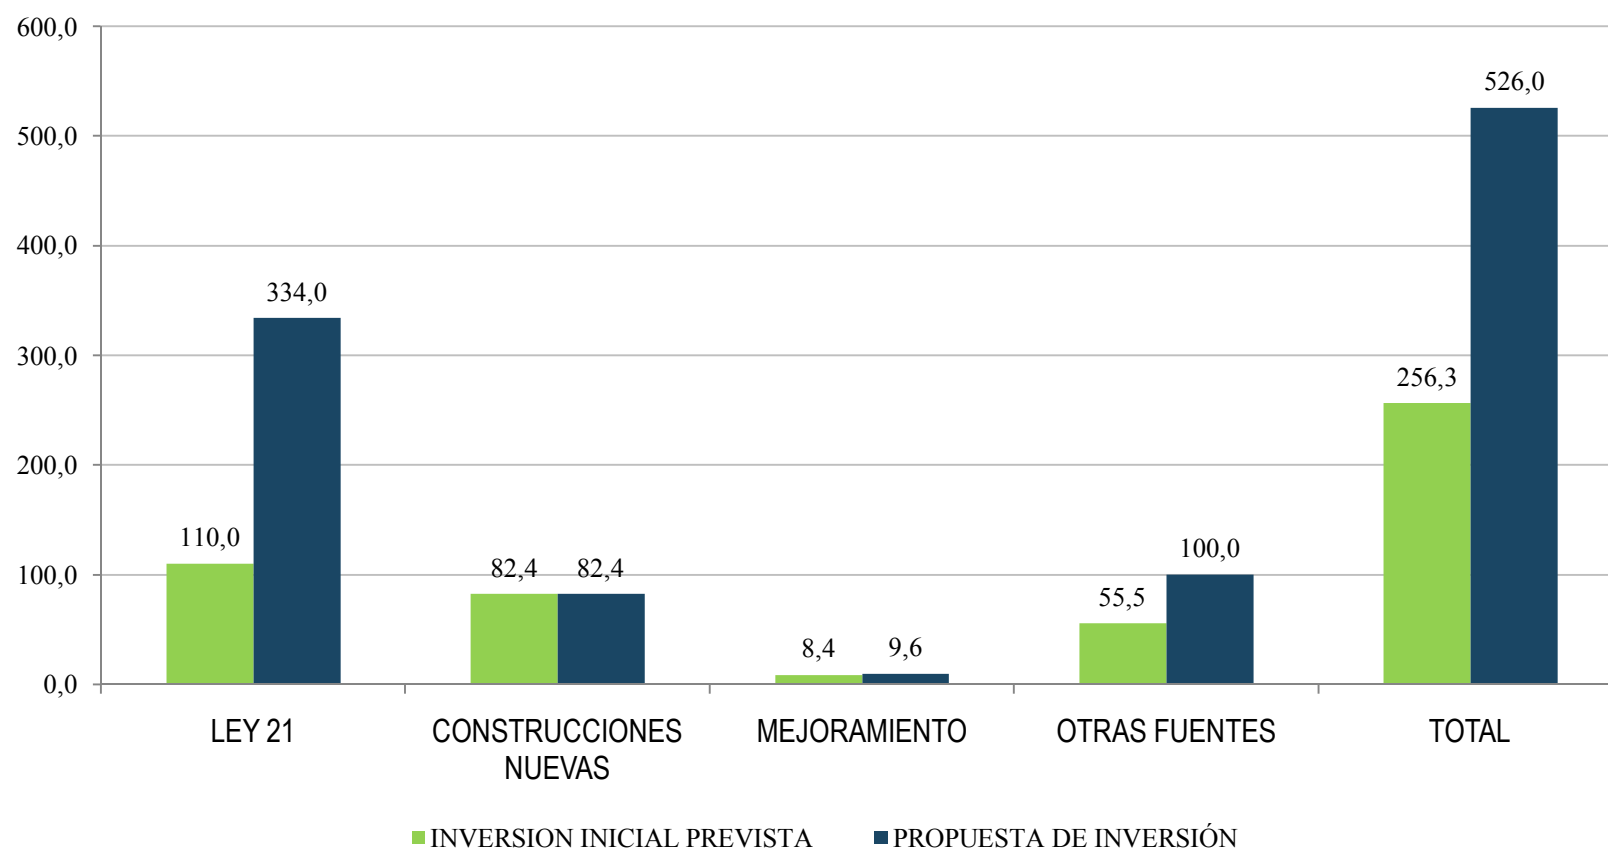

Cifras del gráfico en miles de millones de pesos

GERENCIA DE RECURSOS DELEGADA POR EL MEN – LEY 21
ARQ CONSULTORIA
PBX 6184077

Gerente
Ricardo Leguizamo
Cel: 315 3425525

Directora Técnica
Maria Alejandra Montoya
Cel: 311 2817031

Carrera 13A No. 89-38 oficina 330 Bogotá
